



Secretaría de
**Planificación y
Programación de
la Presidencia**

EXPERIENCIAS Clave de las **Evaluaciones Ex Post 2025"**

DASID


EXPERIENCIA

SNIP NO. 209677
(Reposición de carretera)
4 caminos a Pologua Totonicapán.

- Los diseños fueron elaborados de manera superficial.
- Solo se contemplo la reposición de 16 km, los beneficiarios comentan era necesario extender la intervención.

PERTINENCIA

DASID

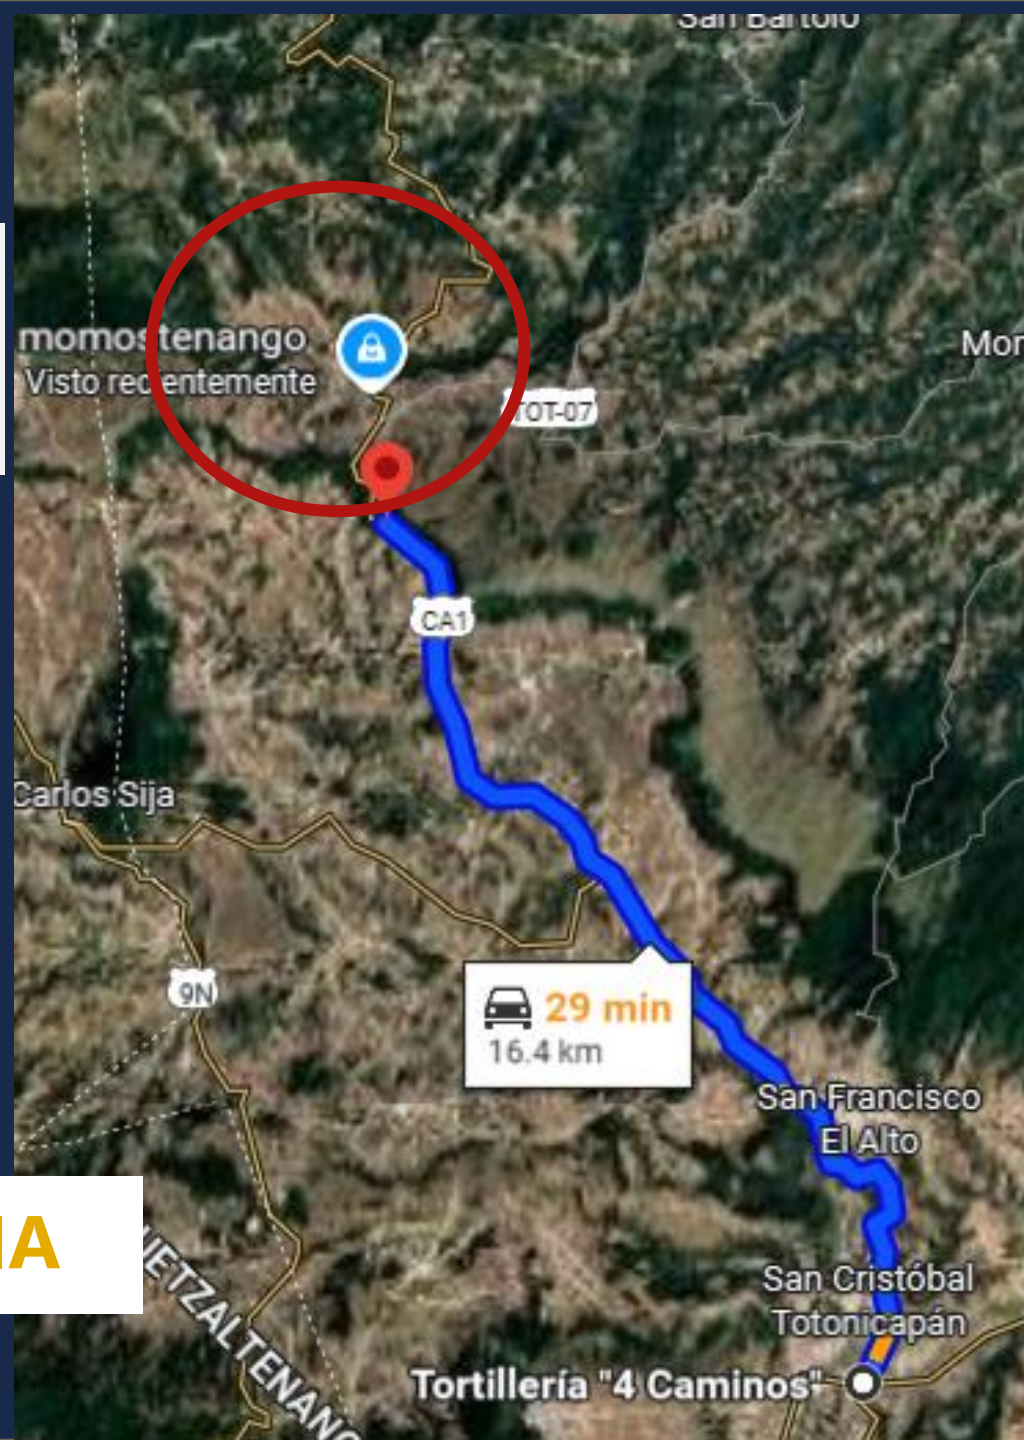

EXPERIENCIA

SNIP NO. 209677 (Reposición de carretera) 4 caminos a Pologua Totonicapán.

Necesidad de incorporar obras adicionales no previstas.

- Estabilización de taludes.
- Construcción de drenajes pluviales.
- Tiempo inicial 12 meses
- Tiempo final 26 meses 123 %
- Monto inicial Q.58 millones.
- Monto final Q. 83 Millones. 39% variación.

EFICIENCIA



25/09/25 11:06
14.98250N 91.48308W
309° NW
San Francisco El Alto
San Francisco el Alto
Totonicapán

EXPERIENCIA

SNIP NO. 209677

(Reposición de carretera)


4 caminos a Pologua Totonicapán.

Los comunitarios ya construyeron túmulos en el tramo mejorado. (COMUNIDAD).

Parqueo de vehículos en los costados de la carretera. (PROVIAL)

Ausencia de rótulos o señalización que desincentiven, el deposito de basura y escombros. (COVIAL)

COHERENCIA

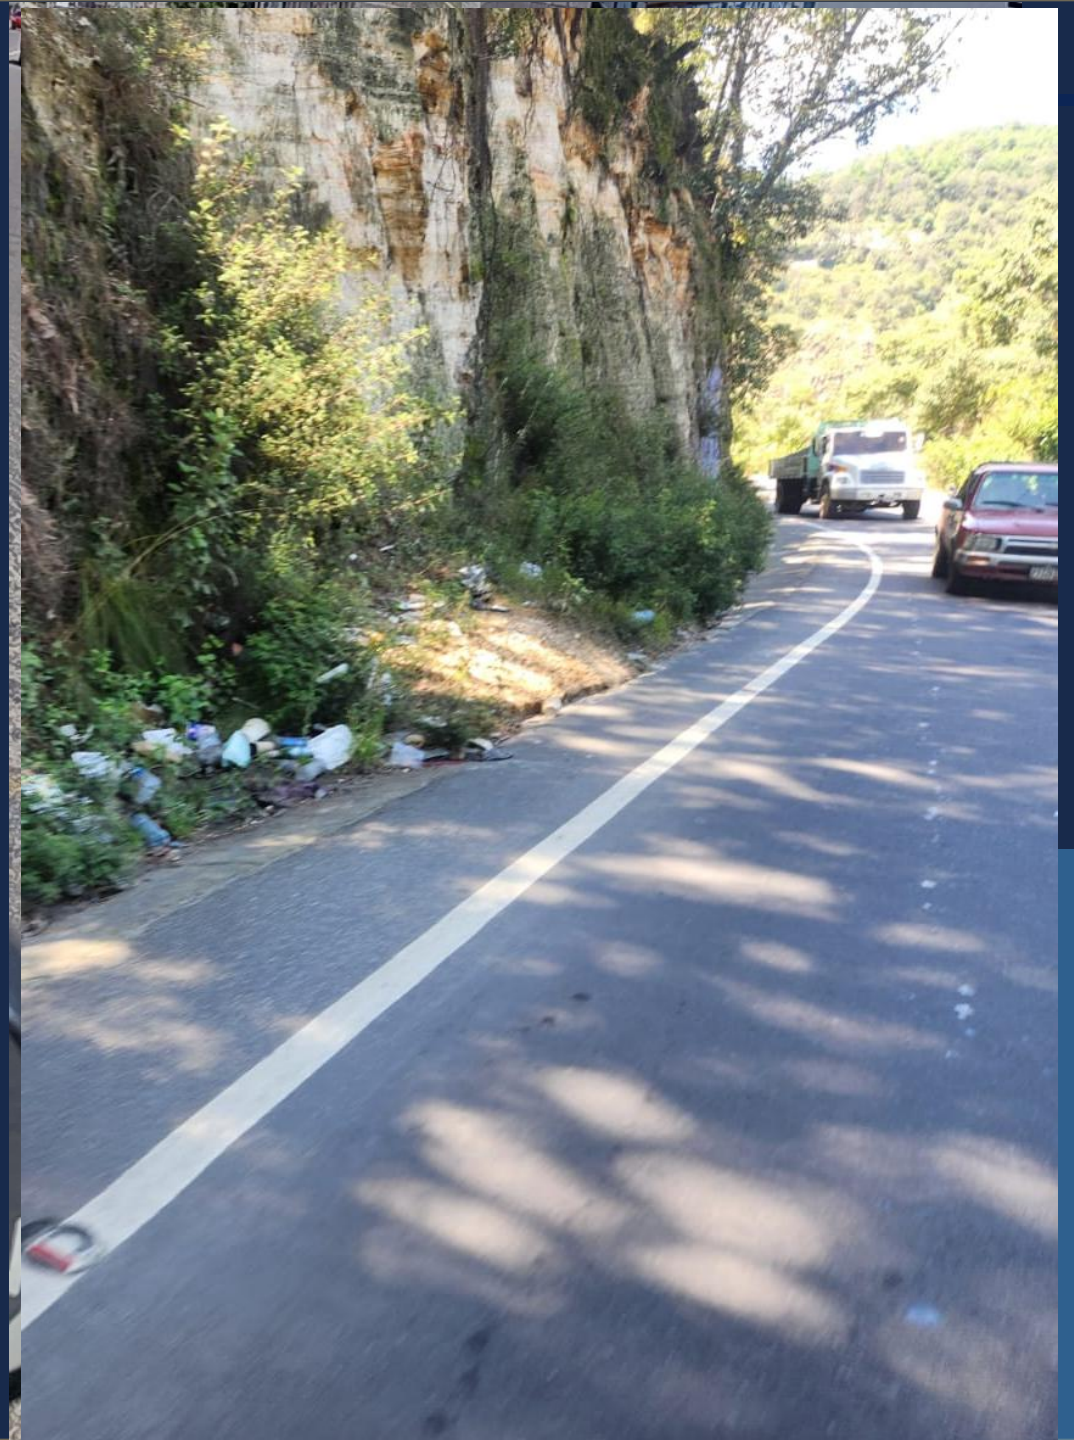

EXPERIENCIA

SNIP NO. 209677

(Reposición de carretera)

4 caminos a Pologua Totonicapán.

**¿Cómo mejorar la coordinación interinstitucional,
en la gestión de proyectos, viales?**

EXPERIENCIA


SNIP NO.133272

(Sistema de agua potable, Aldea Seque)

San Carlos Sija, Quetgo.

La estimación inicial del caudal fue considerablemente superior al caudal real del pozo. Equipo de bombeo con potencia superior mayor al necesario.

El diagnóstico del proyecto omitió información clave sobre los sistemas existentes de abastecimiento de agua. (Se pudo proponer mejorar a los sistemas existentes.)

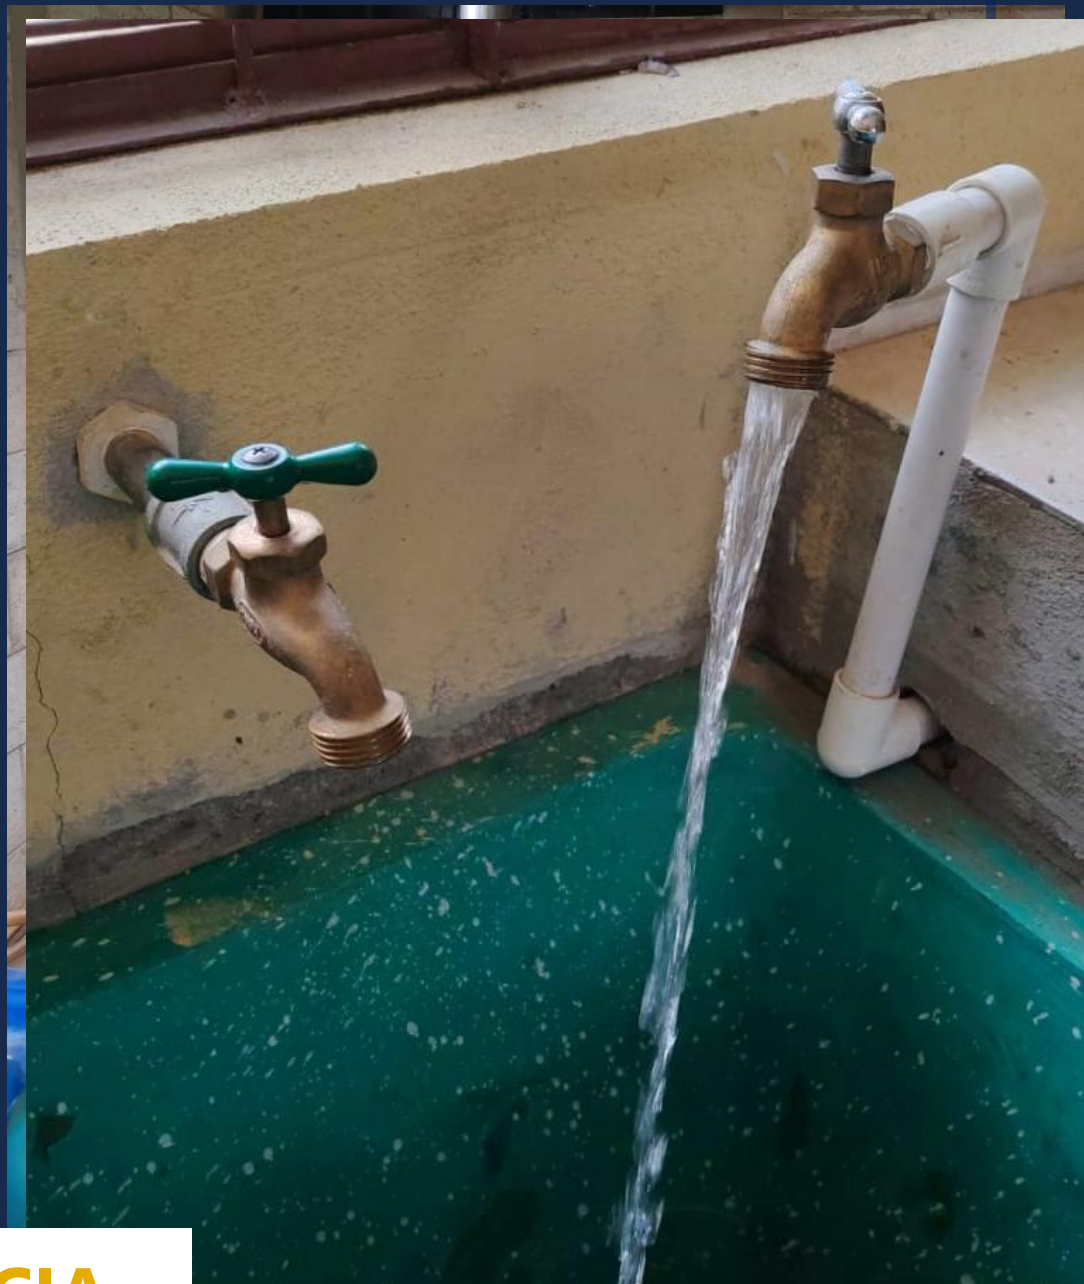

PERTINENCIA

EXPERIENCIA

SNIP NO.133272
(Museo Takalik abaj)
(Asintal Retalhuleu.)

El personal encargado de la operación del parque manifestó que no fue tomado en cuenta durante el proceso de rediseño del museo.



PERTINENCIA

DASID


EXPERIENCIA

SNIP NO.133272
(Museo Takalik abaj)
(Asintal Retalhuleu.)

Ventilación natural a artificial.

Consumo eléctrico de:
Q.18 mil - 32 mil /mensuales.

Filtraciones.

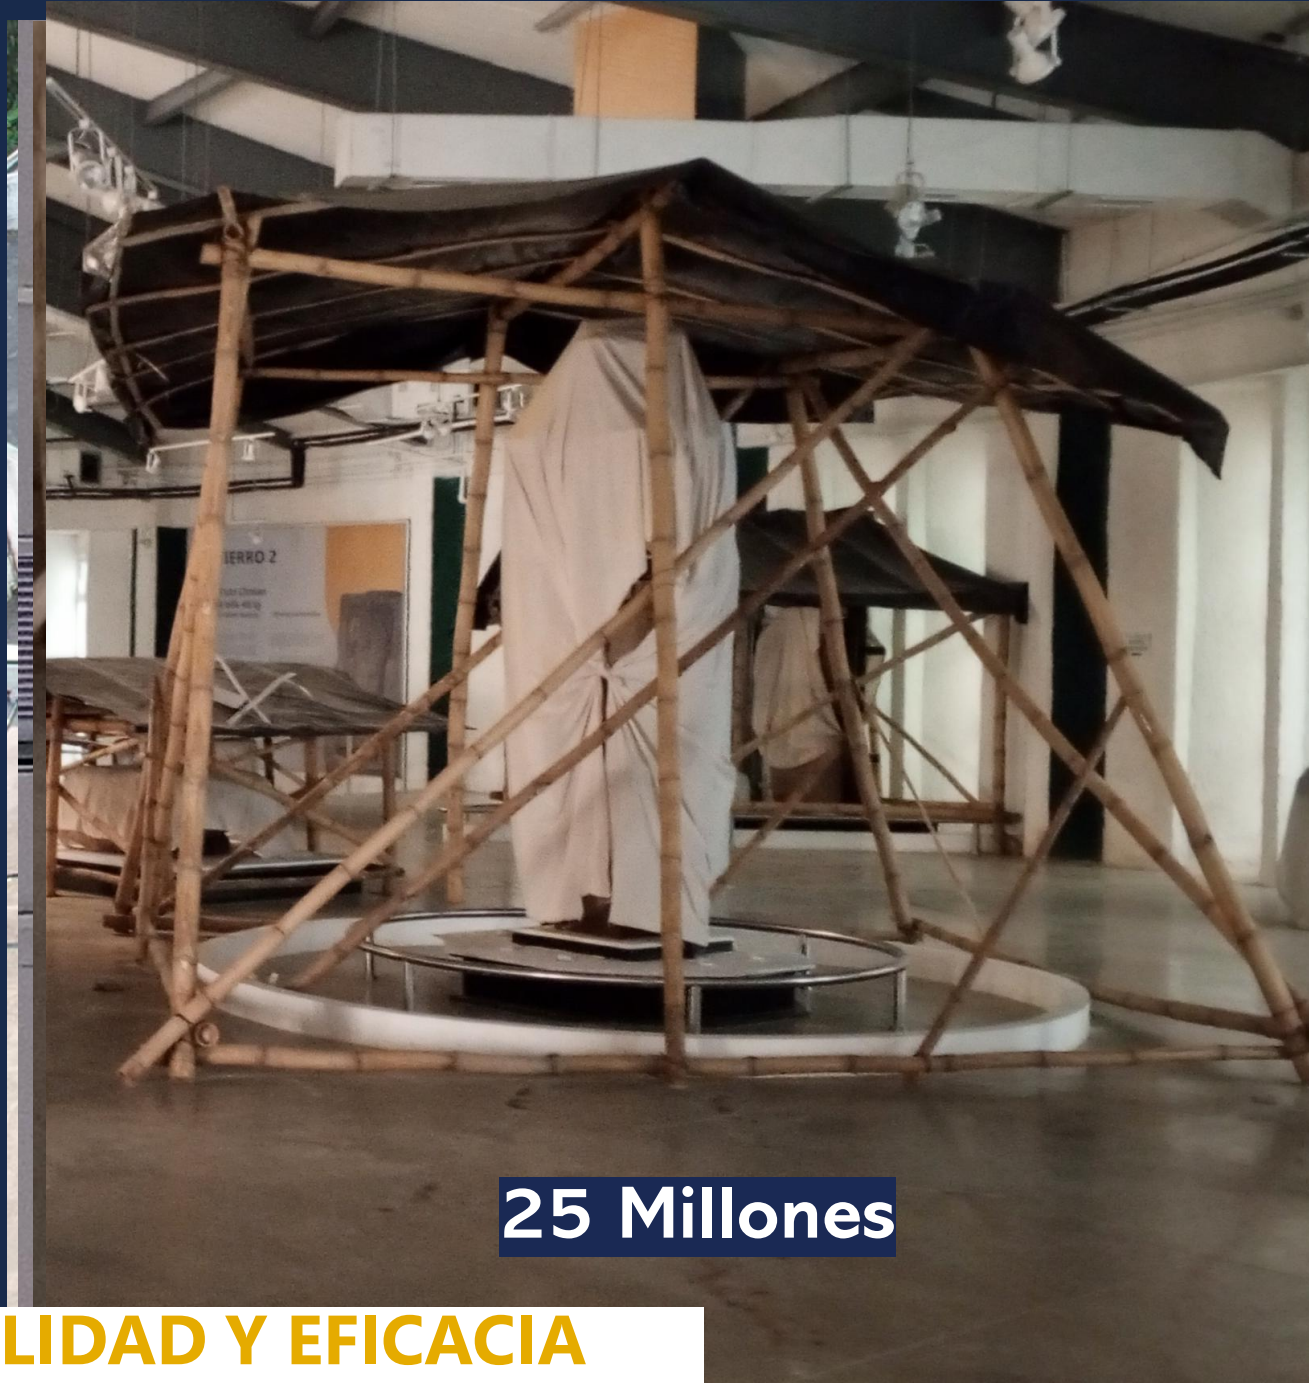

25 Millones

PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD Y EFICACIA

EXPERIENCIA

SNIP NO. 239747

(Instalaciones Deportiva y Recreativas)

Cantón Valle Verde Tacana.

- **Organizan actividades deportivas y funciona como una centralidad para otras comunidades.**

- **No se identifico otro proyecto de esta naturaleza en la región.**



COHERENCIA

DASID

EXPERIENCIA

SNIP NO. 94992

**(Agua potable y letrización)
Aldea el Xab, el asintal, Retalhuleu.**

El estudio indicaba, originalmente, que se captaría de un nacimiento.

En la etapa de ejecución, se determinó que no existía el nacimiento.

Se construyó con un brote de agua superficial, que proviene de una toma del río Jocá, toma que suministra agua para una hidroeléctrica.

Es necesario dialogar con el administrador, para que abran la toma.

PERTINENCIA



EXPERIENCIA

SNIP NO. 94992

(Agua potable y letrinización)

Aldea el Xab, el asintal, Retalhuleu.

La administración, operación y mantenimiento del sistema, está a cargo de una asociación de agua de la comunidad.

Han recibido asesoría por parte de personal de Gestión Social contratado por el programa BID/INFOM y personal de Gestión Social de UNEPAR

Se leen medidores, y la cuota les permite cubrir costos de operación y mantenimiento.



SOSTENIBILIDAD

DASID

EXPERIENCIA

SNIP NO. 260708
(Planta y Alcantarillado)
Lotificación San Rafael, el Asintal
Retalhuleu.

El sistema no esta funcionando.

La donante del predio, indica que se construyó la planta, en un espacio que no era.

Si existe escritura del predio.

No esta de acuerdo que este opere ahí, y no existe servidumbre de paso.



4.5 Millones

PERTINENCIA

Qué acciones, a nivel de autoridad institucional, implementaría para fortalecer el aspecto técnico- legal durante la planificación de los proyectos para evitar ambigüedades u omisiones en los documentos que dan certeza legal a la propiedad del terreno. (derecho de vía, derechos de paso y donaciones de terreno)

EXPERIENCIA

SNIP NO. 264799

(REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION)

(El Esfuerzo, San Juan Bautista, Suchitepequez).

El proyecto paso a la empresa ENERGUATE, para su administración, operación y prestación de servicio.

Lideres y algunos vecinos, informaron que desde que entró en funcionamiento, ellos mismos se han encargado del desrame de arboles, cercanos a las líneas.

Han tenido interrupciones hasta de 72 hrs.

SOSTENIBILIDAD



EXPERIENCIA

SNIP NO. 274271

(SISTEMA DE AGUA POTABLE)

(Sector Sinai II, Aldea Sibana, El Asintal Retalhuleu).

La caja del clorinador fue diseñada para instalarse en la salida del flujo de agua para distribución.


No toda la red construida cuenta con contadores de agua.

Estudio de preinversión no contempló la acometida eléctrica, para funcionamiento del equipo de bombeo.

PERTINENCIA

Una persona dio su testimonio y confirmó que, por hacer uso del agua contaminada de su pozo, ha padecido de infecciones gastrointestinales y actualmente padece de enfermedades de la piel.

EFICACIA

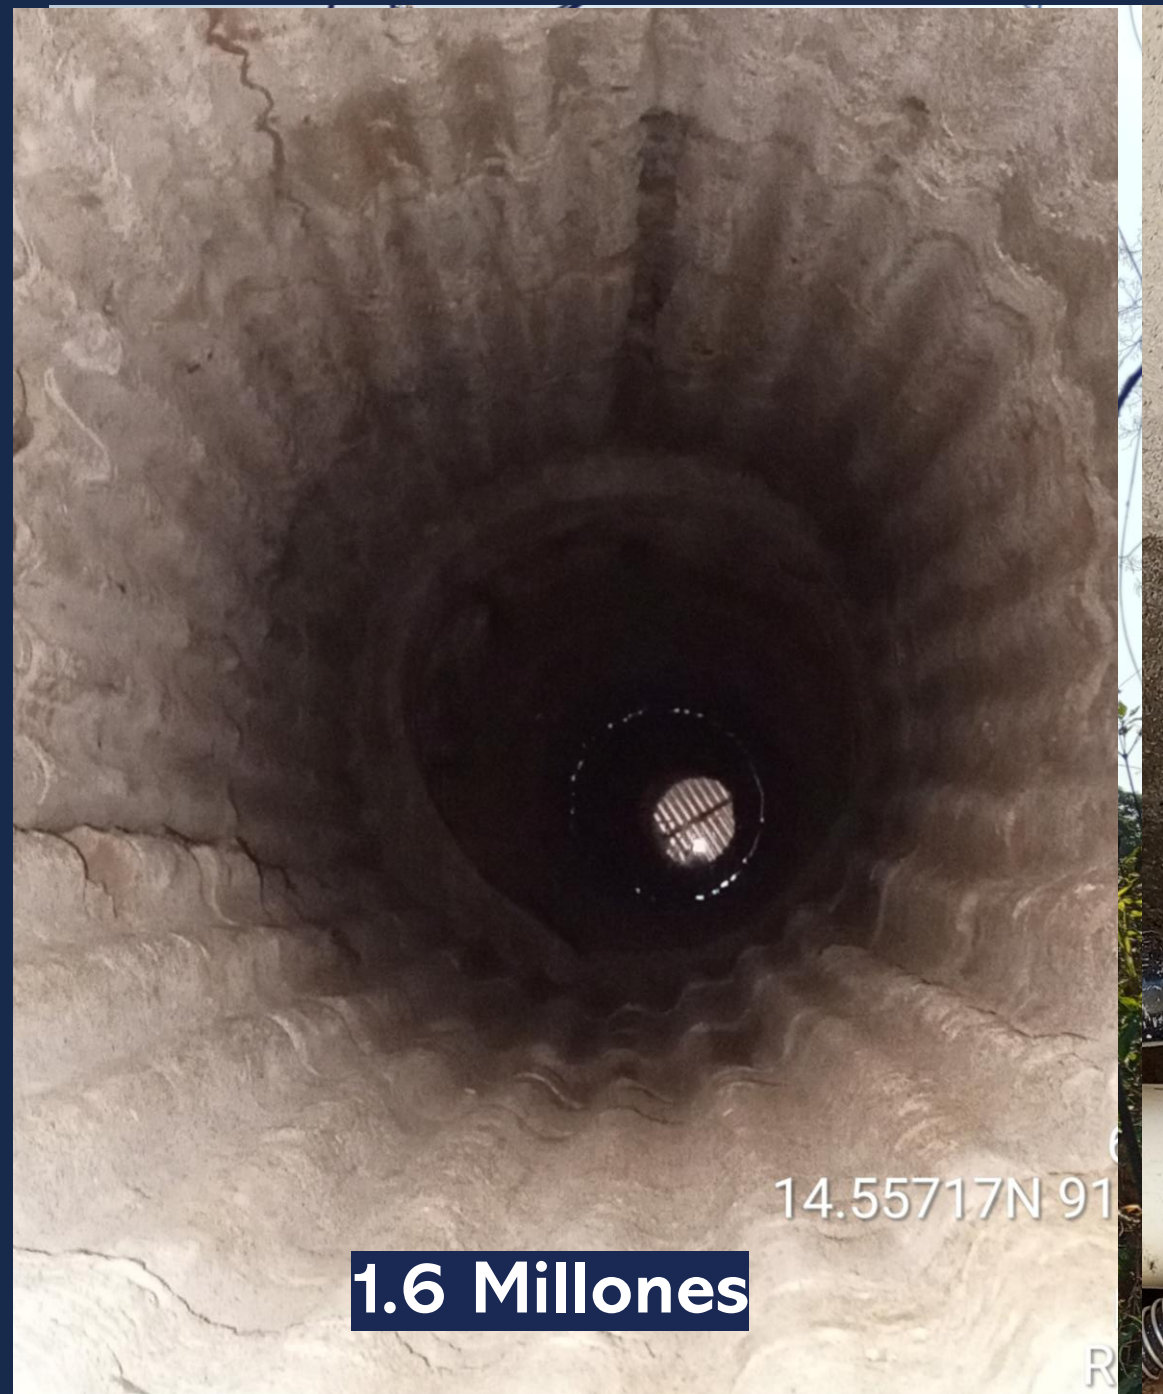

EXPERIENCIA

SNIP NO. 300144
(SISTEMA DE AGUA POTABLE)
(Sector La Loma, Cantón Bacajia I
San Andres Villa Seca Retalhuleu).

En días nublados los paneles no generan la energía suficiente para que la bomba funcione.

PERTINENCIA

Cada usuario paga la cantidad de Q.10.00/mes y no necesitan subsidio.

SOSTENIBILIDAD

Ha contribuido a disminuir la enfermedades gastrointestinales.

EFICACIA



EXPERIENCIA

SNIP NO. 133671

(REPOSICION ESCUELA PRIMARIA)

(Aldea Tzucubal, Santa Catarina Ixtahuacan, Sololá).

- No se presentó el diseño arquitectónico a la comunidad.
- El abastecimiento de agua, no se contemplo, inicialmente.
- El sistema eléctrico no cubre todos los ambiente.

PERTINENCIA

- 3 aulas y servicio sanitario.
- Modulo de gradas y 3 aulas en el 2do nivel.
- Suspendido 5 veces.

- Tiempo inicial 8 meses (2014)
- Tiempo final 101.8 meses
- 1,172.50%

EFICIENCIA




EXPERIENCIA

SNIP NO. 310812 (CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR) (Jucanya Sur Panajachel Sololá).

- Los estudios incluidos databan del año 2002.
El estudio hidrológico no era específico para el puente.
El expediente correspondía a una copia de otro proyecto de puente peatonal.
No se construyó, derivado de las deficiencias.
- La asociación de Tuc Tuqueros y vecinos, decidieron construir un puente peatonal, por su cuenta.

PERTINENCIA







Secretaría de
**Planificación y
Programación de
la Presidencia**

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DASID
